Udbudstidsplan

VB 45 - Lægeklinik

Ishøj Kommune

Center for Ejendomme
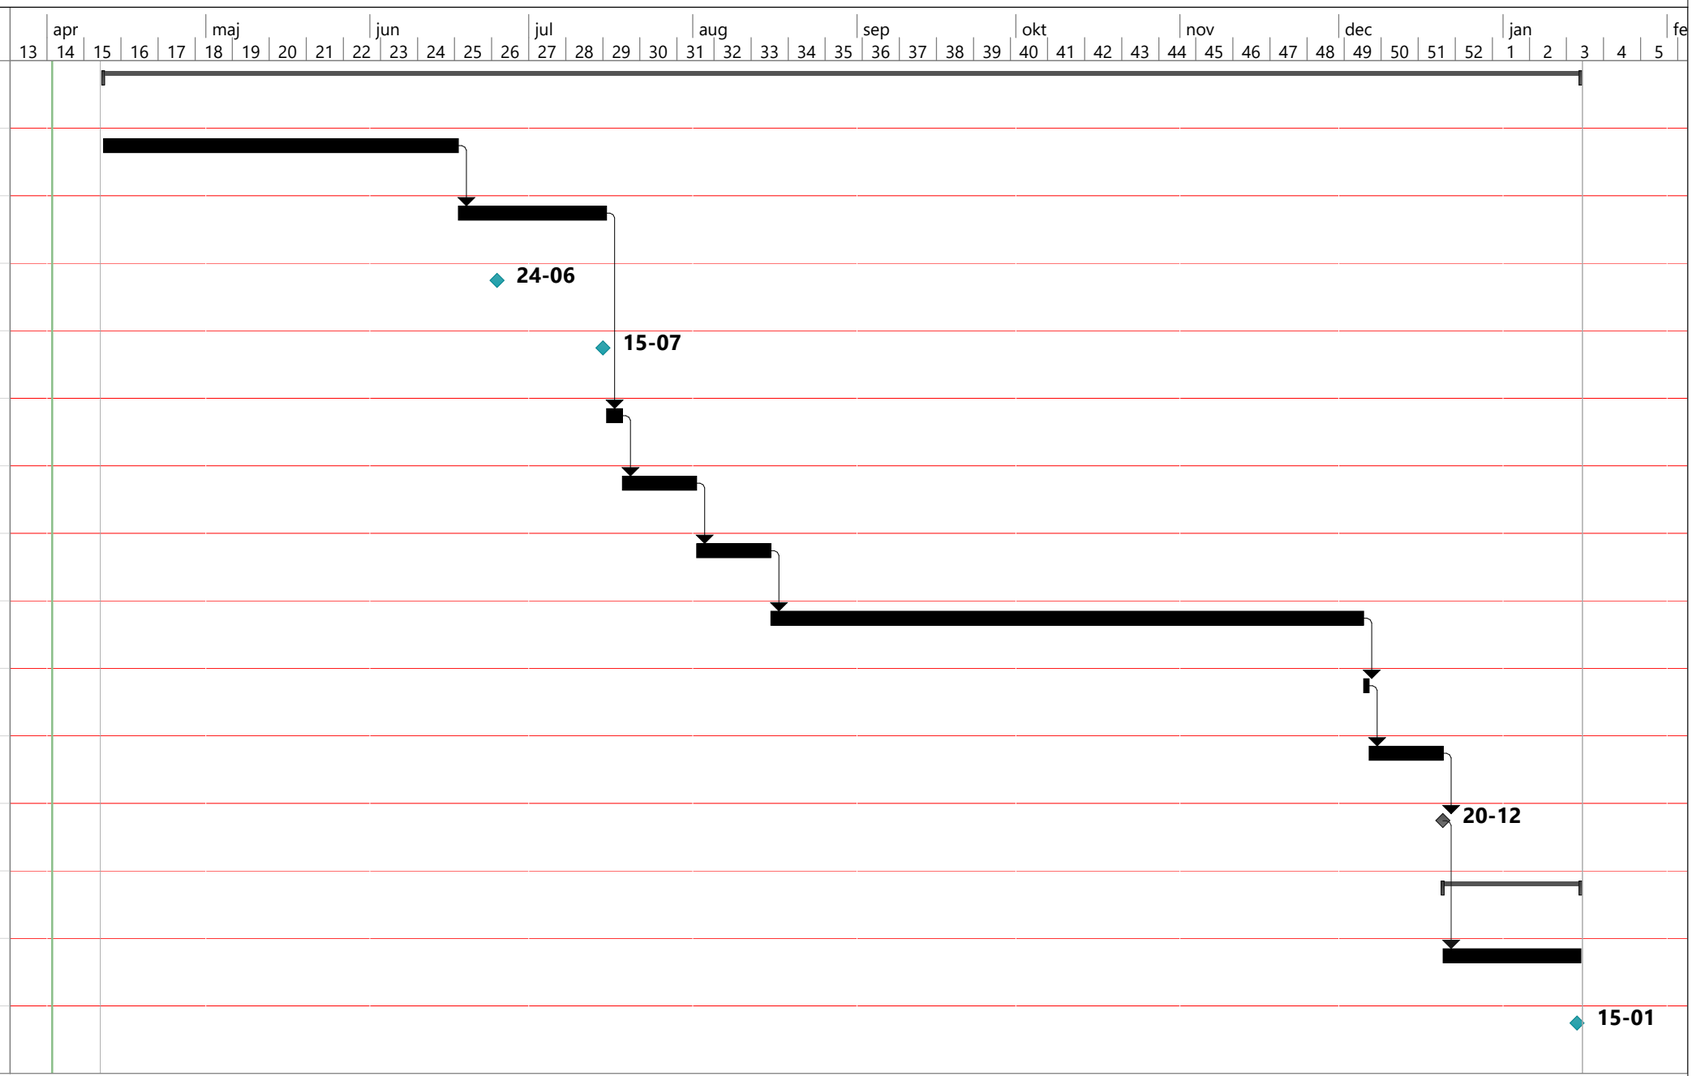
Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato
1	**VB 45 - Lægeklinik**	**184 dage**	**to 11-04-19**	**on 15-01-20**
2	Projektering	40 dage	to 11-04-19	ma 17-06-19
3	Tilbudsberegning	20 dage	ma 17-06-19	ma 15-07-19
4	Besigtigelse	0 dage	ma 24-06-19	ma 24-06-19
5	Tilbud aflevering	0 dage	ma 15-07-19	ma 15-07-19
6	Gennemgå tilbud	3 dage	ma 15-07-19	to 18-07-19
7	Kontrahering	10 dage	to 18-07-19	to 01-08-19
8	Opstart byggeplads	10 dage	to 01-08-19	to 15-08-19
9	Udførelsesperiode	80 dage	to 15-08-19	to 05-12-19
10	Mangelgennemgang	1 dag	to 05-12-19	fr 06-12-19
11	Mangeludbedring	10 dage	fr 06-12-19	fr 20-12-19
12	Afleveringsforretning	0 dage	fr 20-12-19	fr 20-12-19
13	**Læger overtager**	**10 dage**	**fr 20-12-19**	**on 15-01-20**
14	Lægernes inventar	10 dage	fr 20-12-19	on 15-01-20
15	1. Patient	0 dage	on 15-01-20	on 15-01-20
