Ishøj Kommune
Brohuset

Oplæg til Tidsplan
Totalentreprisekonkurrence (EU-udbud med forhandling) med partnering

09.09.19 /JL

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato
1	**Planlægning af udbudsmateriale**	**31 dage**	**ma 19-08-19**
2	Møde om udbudsstrategi	0 dage	ma 19-08-19
3	Udbudsstrategi revideret	5 dage	ma 19-08-19
4	Møde med Teknisk Chefgruppe	0 dage	fr 23-08-19
5	Godkendelse Direktion	0 dage	ma 02-09-19
6	Godkendelse TBU	0 dage	ti 17-09-19
7	Godkendels etapeplan ØPU	0 dage	ma 23-09-19
8	Godkendelse etapeplan BR	0 dage	ti 01-10-19
9			
10	**Udbudsmateriale**	**33 dage**	**on 02-10-19**
11	Planlægningsmøde	0 dage	on 02-10-19
12	Udbudsbekendtgørelse	23 dage	to 03-10-19
13	Udbuds- og konkurrencebetingelser	23 dage	to 03-10-19
14	Ydelsesbeskrivelse	23 dage	to 03-10-19
15	Tilbudsliste	23 dage	to 03-10-19
16	ABT + Generelle Bestemmelser	23 dage	to 03-10-19
17	Partneringaftale	23 dage	to 03-10-19
18	PQ-materiale	23 dage	to 03-10-19
19	Planlægningsmøde	0 dage	ma 04-11-19
20	Juridisk tjek	5 dage	ti 05-11-19
21	Endeligt udbudsmateriale	10 dage	ti 05-11-19
22			
23	**Prækvalifikation mm.**	**47 dage**	**ma 18-11-19**
24	Afsendelse af bekendtgørelse	0 dage	ma 18-11-19
25	Anmodningsfrist (min. 30 kalenderdage)	23 dage	ti 19-11-19
26	Modtagelse af anmodninger	0 dage	fr 20-12-19
27	Juleferie	9 dage	ma 23-12-19
28	Vurdering af anmodninger	8 dage	fr 03-01-20
29	Vurderingsmøde	0 dage	ti 14-01-20
30	Indstilling af tilbudsgivere og meddelsesbreve	4 dage	on 15-01-20
31	Udarbejdelse af meddelelsesbreve	4 dage	on 15-01-20
32	Godkendelse TBU	0 dage	ti 21-01-20
33	Samtidig meddelelse om prækvalifikation	0 dage	on 22-01-20
34			
35	**Konkurrencefasen**	**68 dage**	**on 22-01-20**
36	Budopfordring	0 dage	on 22-01-20
37	Tilbudsperiode (min. 25 kalenderdage)	19 dage	to 23-01-20
38	Besigtigelse- og spørgemøde	0 dage	fr 31-01-20
39	Modtagelse af tilbud	0 dage	ti 18-02-20
40	Præsentation af tilbud	0 dage	on 19-02-20
41	Tilbudsvurdering	5 dage	to 20-02-20
42	Vurderingsmøde	0 dage	on 26-02-20
43	1. forhandlingsmøde	0 dage	to 27-02-20
44	Udarbejde og udsende forhandlingsnotat	2 dage	fr 28-02-20
45	Modtage rev. Tilbud	0 dage	ma 09-03-20
46	Tilbudsvurdering	4 dage	ti 10-03-20
47	Vurderingsmøde	0 dage	fr 13-03-20
48	Indstilling af vinder	1 dag	ma 16-03-20
49	Udarbejdelse af meddelelsesbreve	1 dag	ti 17-03-20
50	Godkendelse TBU	0 dage	on 18-03-20
51	Godkendelse ØPU	0 dage	ma 23-03-20
52	Godkendelse BR	0 dage	ti 07-04-20
53	Samtidig meddelelse til de bydende	0 dage	on 08-04-20
54	Stand still periode	8 dage	to 09-04-20
55	Indgåelse af teamentrepriseaftale.	5 dage	ti 21-04-20
56			
57	**Bekendtgørelse om indgået kontrakt**	**10 dage**	**ti 28-04-20**
58	Bekendtgørelse om indgået kontrakt	10 dage	ti 28-04-20
59			
60	**Partneringseminar mm**	**0 dage**	**ti 28-04-20**
61	Partneringseminar	0 dage	ti 28-04-20

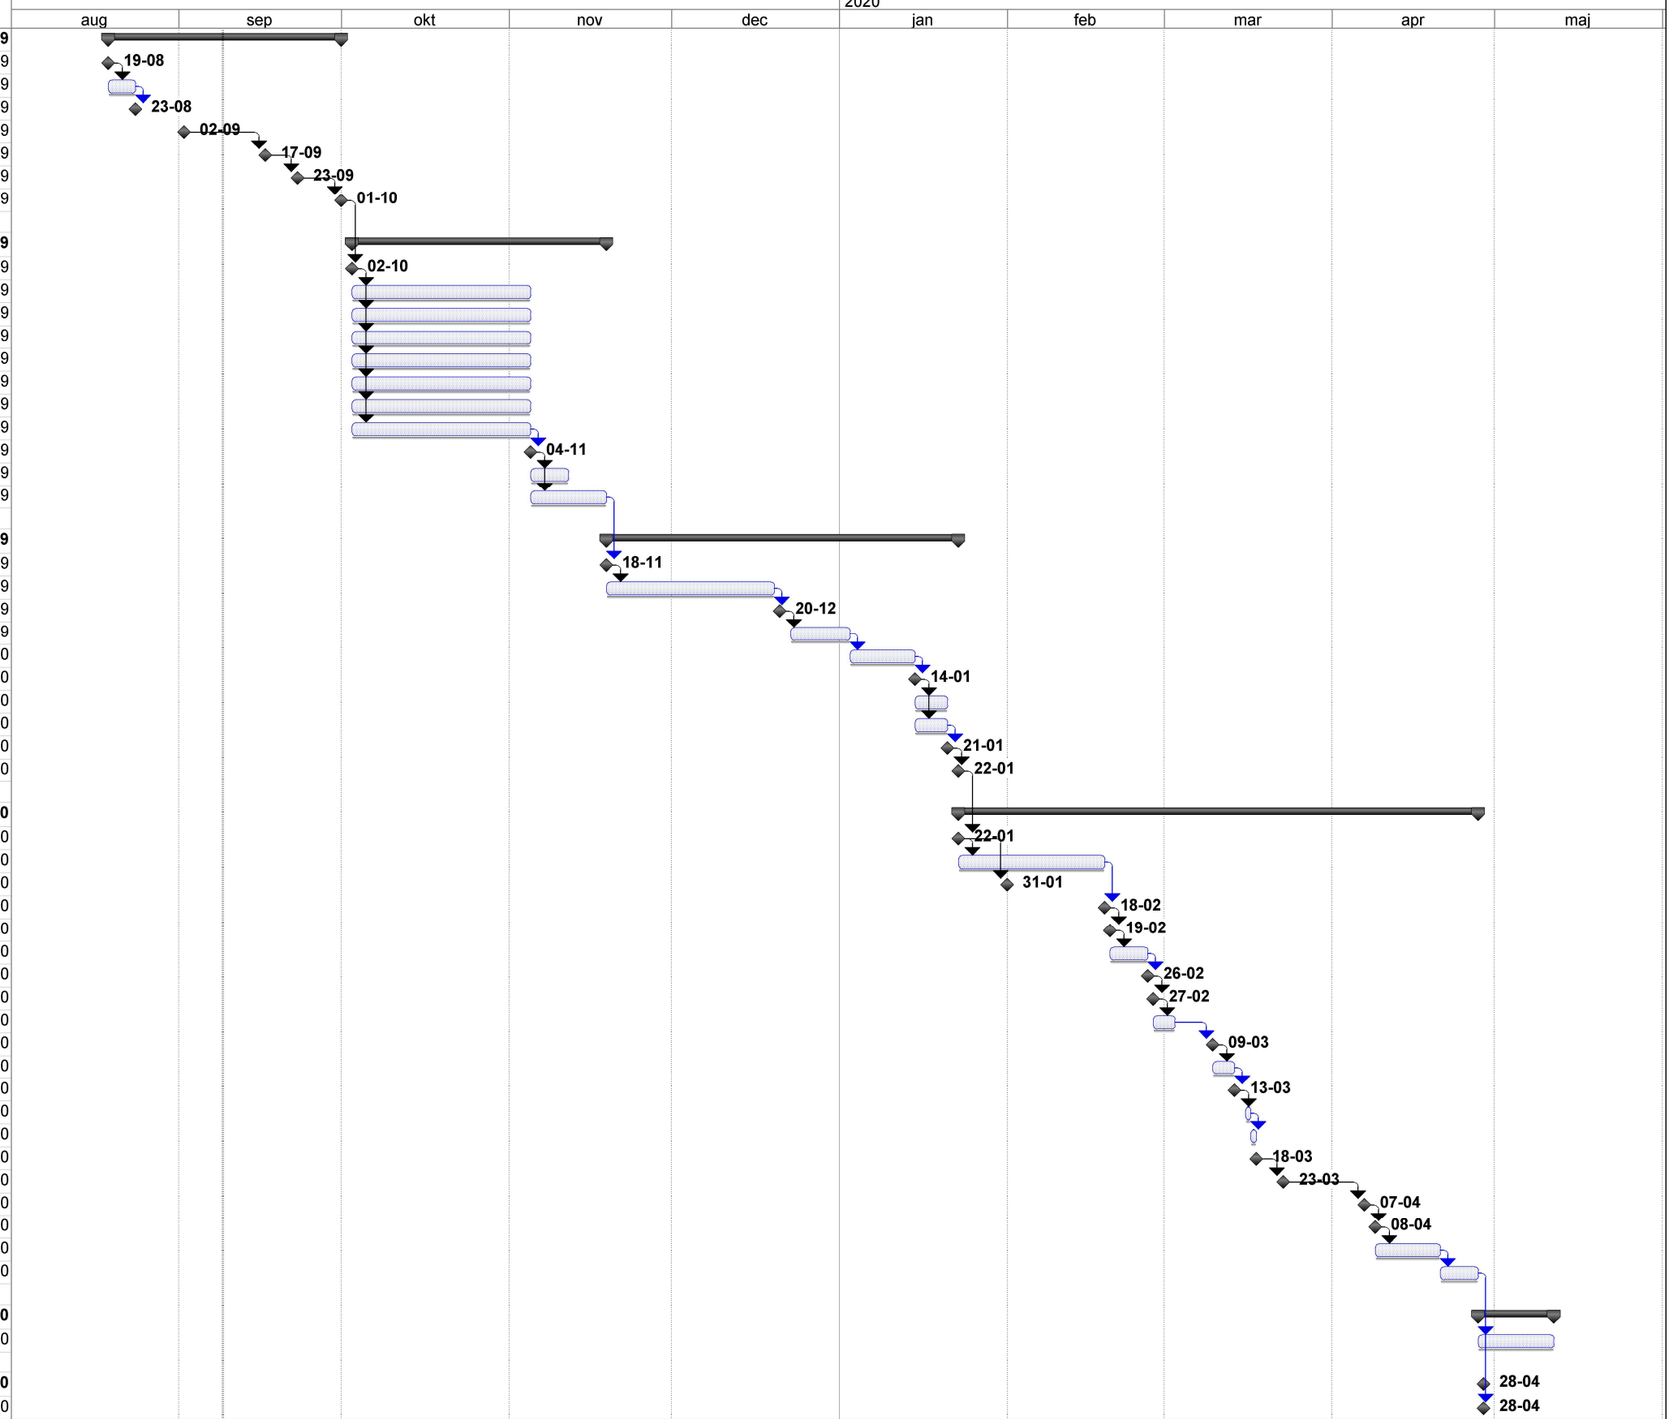

Lilholm & Partnere
