Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Foregående opgaver
1	Afklaring og opstart	10 dage	ma 01-08-16	fr 12-08-16	
2	Markedsafdækning	6 dage	ma 15-08-16	ma 22-08-16	
3	Udarbejde udbudsmateriale	45 dage	ma 15-08-16	fr 14-10-16	
4	Økonomi og Planudvalgsmøde	0 dage	ma 24-10-16	ma 24-10-16	
5	Byrådsmøde	0 dage	ti 01-11-16	ti 01-11-16	
6	Færdiggørelse af udbudsmateriale	2 dage	on 02-11-16	to 03-11-16	
7	Prækvalifikation	24 dage	fr 04-11-16	on 07-12-16	6
8	Vurdere prækvalifikationer	2 dage	to 08-12-16	fr 09-12-16	7
9	Tilbudsindhentning	30 dage	ma 12-12-16	fr 20-01-17	8
10	Vurdering af tilbud	5 dage	ma 23-01-17	fr 27-01-17	9
11	Forhandling	25 dage	ma 30-01-17	fr 03-03-17	10
12	Tildeling	5 dage	ma 06-03-17	fr 10-03-17	11
13	Valg af leverandør	0 dage	ma 13-03-17	ma 13-03-17	12
14	Implementering	58 dage	ma 13-03-17	on 31-05-17	13

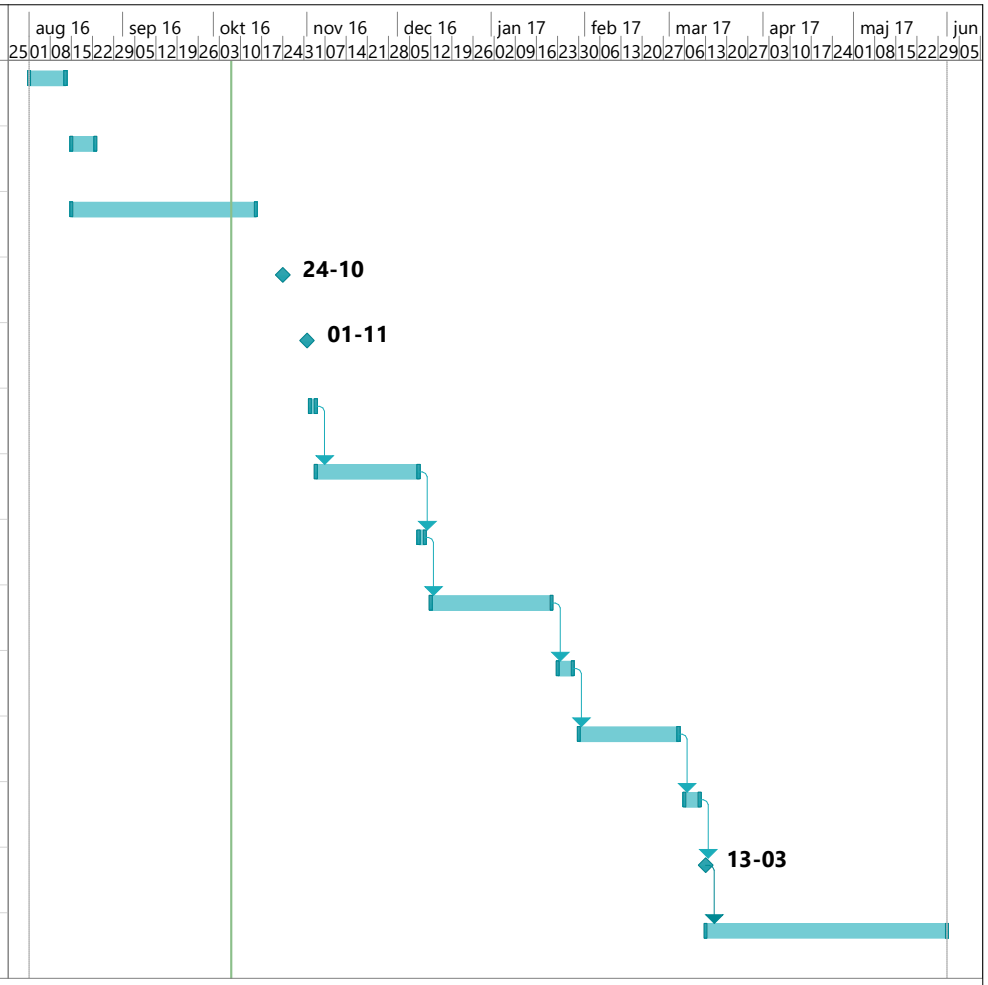

Projekt: Projektplan 071016
Dato: fr 07-10-16

Opgave	Inaktiv opgave	Manuel oversigtsopløftning	Ekstern milepæl
Opdeling	Inaktiv milepæl	Manuel oversigt	Deadline
Milepæl	Inaktiv oversigt	kun start	Fremdrift
Hovedopgave	Manuel opgave	Kun slutdato	Manuel status
Projektoversigt	Kun varighed	Eksterne opgaver	
