Ishøj Kommune
Brohuset

Oplæg til Tidsplan
Teamentreprise (EU-udbud med forhandling) med partnering

03.09.19 /JL

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato
1	**Partneringseminar mm**	**0 dage**	**ti 28-04-20**
3			
4	**Etape 1 - Foreninger & Unge + nedrivning**	**235 dage**	**ti 28-04-20**
5	**Projektering**	**80 dage**	**ti 28-04-20**
17	**Udførelse**	**150 dage**	**ti 28-07-20**
18	Mobilisering	15 dage	ti 28-07-20
19	Udførelse	120 dage	ti 18-08-20
20	Aflevering	0 dage	ma 01-02-21
21	Indflytning	15 dage	ti 02-02-21
22	Ibrugtagning	0 dage	ma 22-02-21
23	**Nedrivning 1988 tilbygning + 45b**	**130 dage**	**ti 22-09-20**
24	Nedrivnings projekt	20 dage	ti 22-09-20
25	Ansøgning om nedrivning	30 dage	ti 20-10-20
26	Myndighedsbehandling	20 dage	ti 01-12-20
27	Nedrivningstilladelse	0 dage	ti 29-12-20
28	Miljøsanering og nedrivning 1988 tilbygning	40 dage	ti 29-12-20
29	Miljøsanering og nedrivning 45b	20 dage	ti 23-02-21
30	Aflevering	0 dage	ma 22-03-21
31			
32	**Etape 2 - Rehabilitering & Genoptræning**	**400 dage**	**ti 20-10-20**
33	**Projektering**	**125 dage**	**ti 20-10-20**
45	**Udførelse**	**290 dage**	**ti 23-03-21**
51			
52	**Etape 3 - Hjælpemiddel og Værksted**	**270 dage**	**ti 16-11-21**
53	**Projektering**	**115 dage**	**ti 16-11-21**
65	**Udførelse**	**165 dage**	**ti 12-04-22**
71			
72	**Etape 4 - Udearealer**	**145 dage**	**on 02-11-22**
73	**Projektering**	**85 dage**	**on 02-11-22**
84	**Udførelse**	**75 dage**	**on 08-02-23**
89			
90	**Udflytning Next**	**31 dage**	**ma 03-08-20**
93			
94	**Lokalplan**	**294 dage?**	**to 01-08-19**

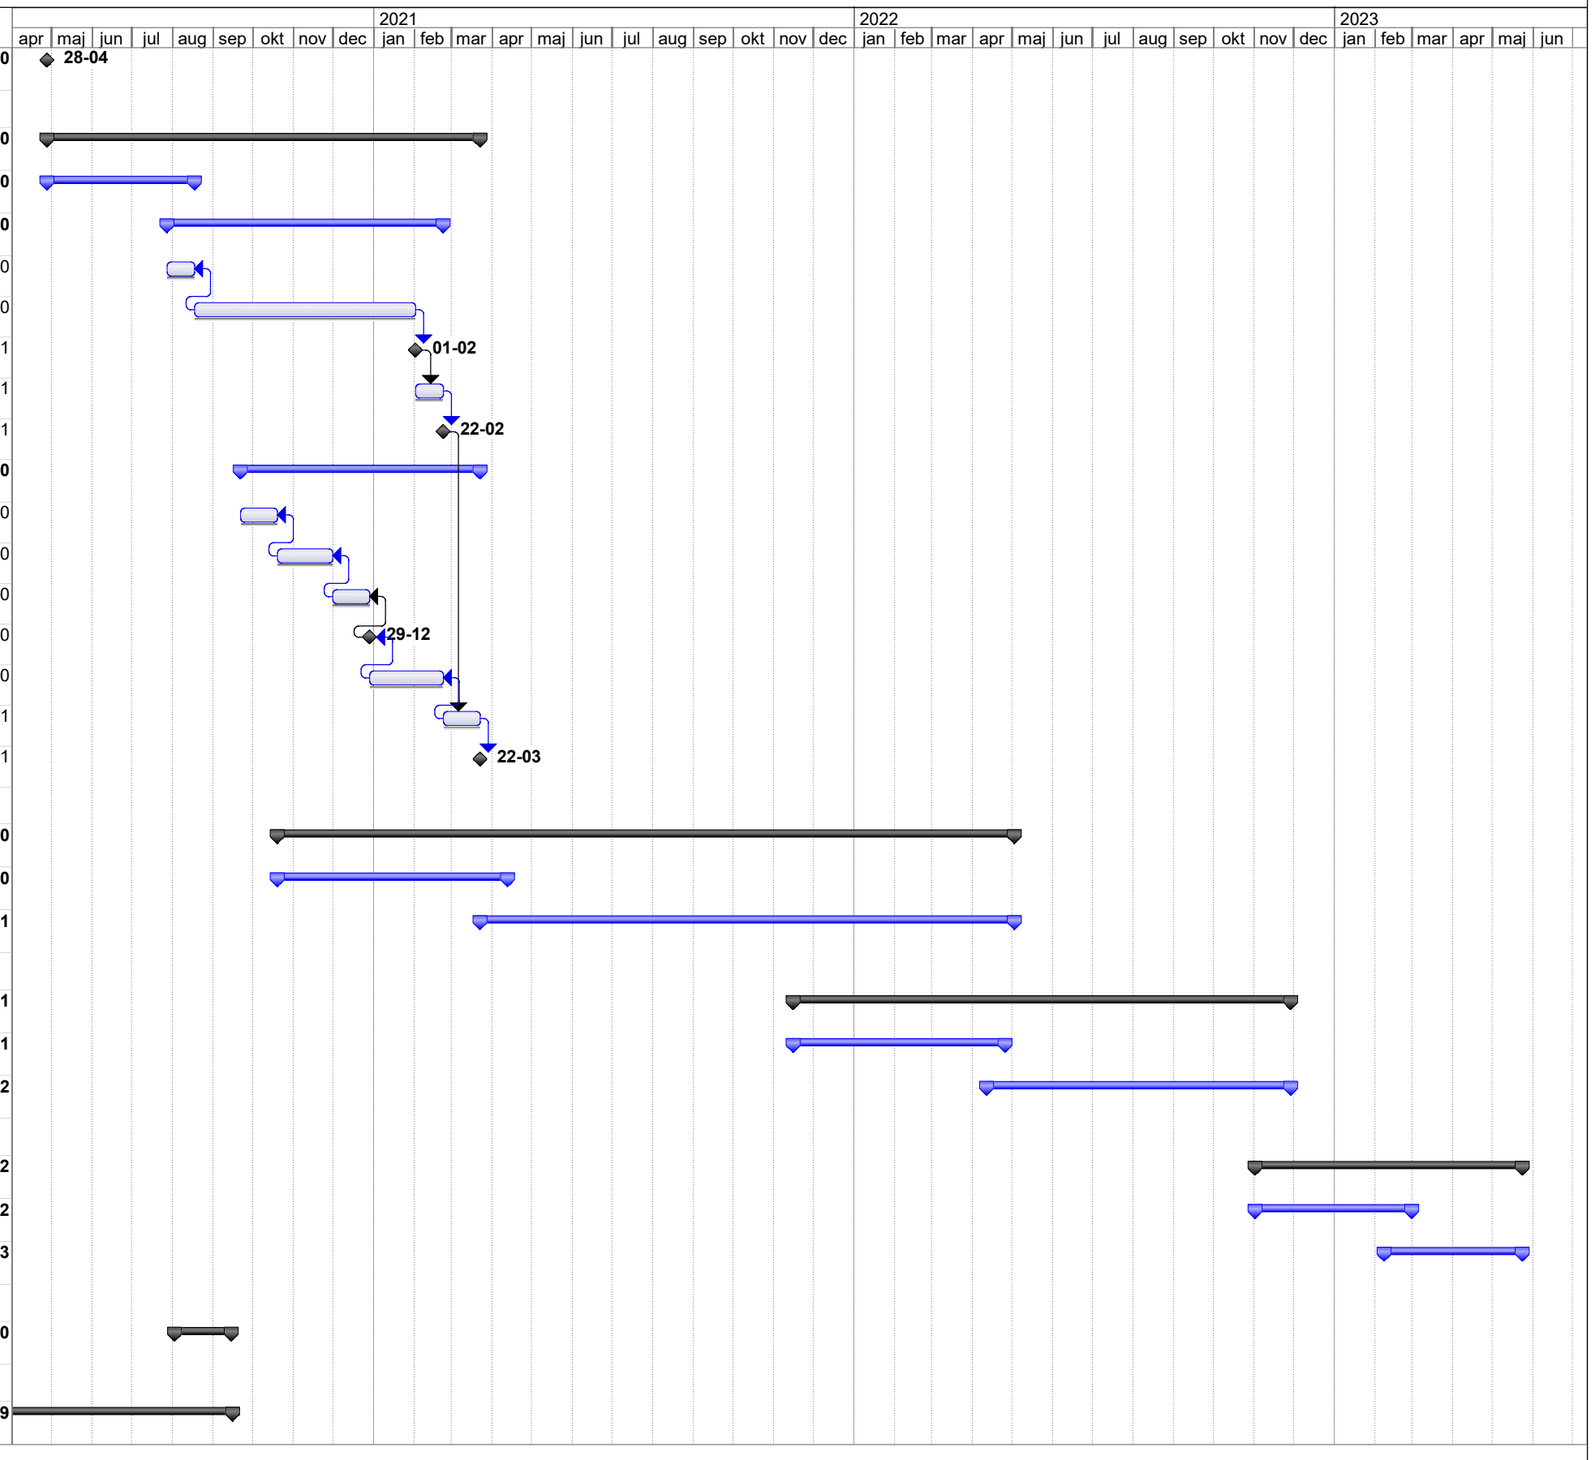

Lilholm & Partnere
